




Projektēto tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas
kustības virzieniem. Darbu veikšanas variants.
(Ziedu iela)
M1:500

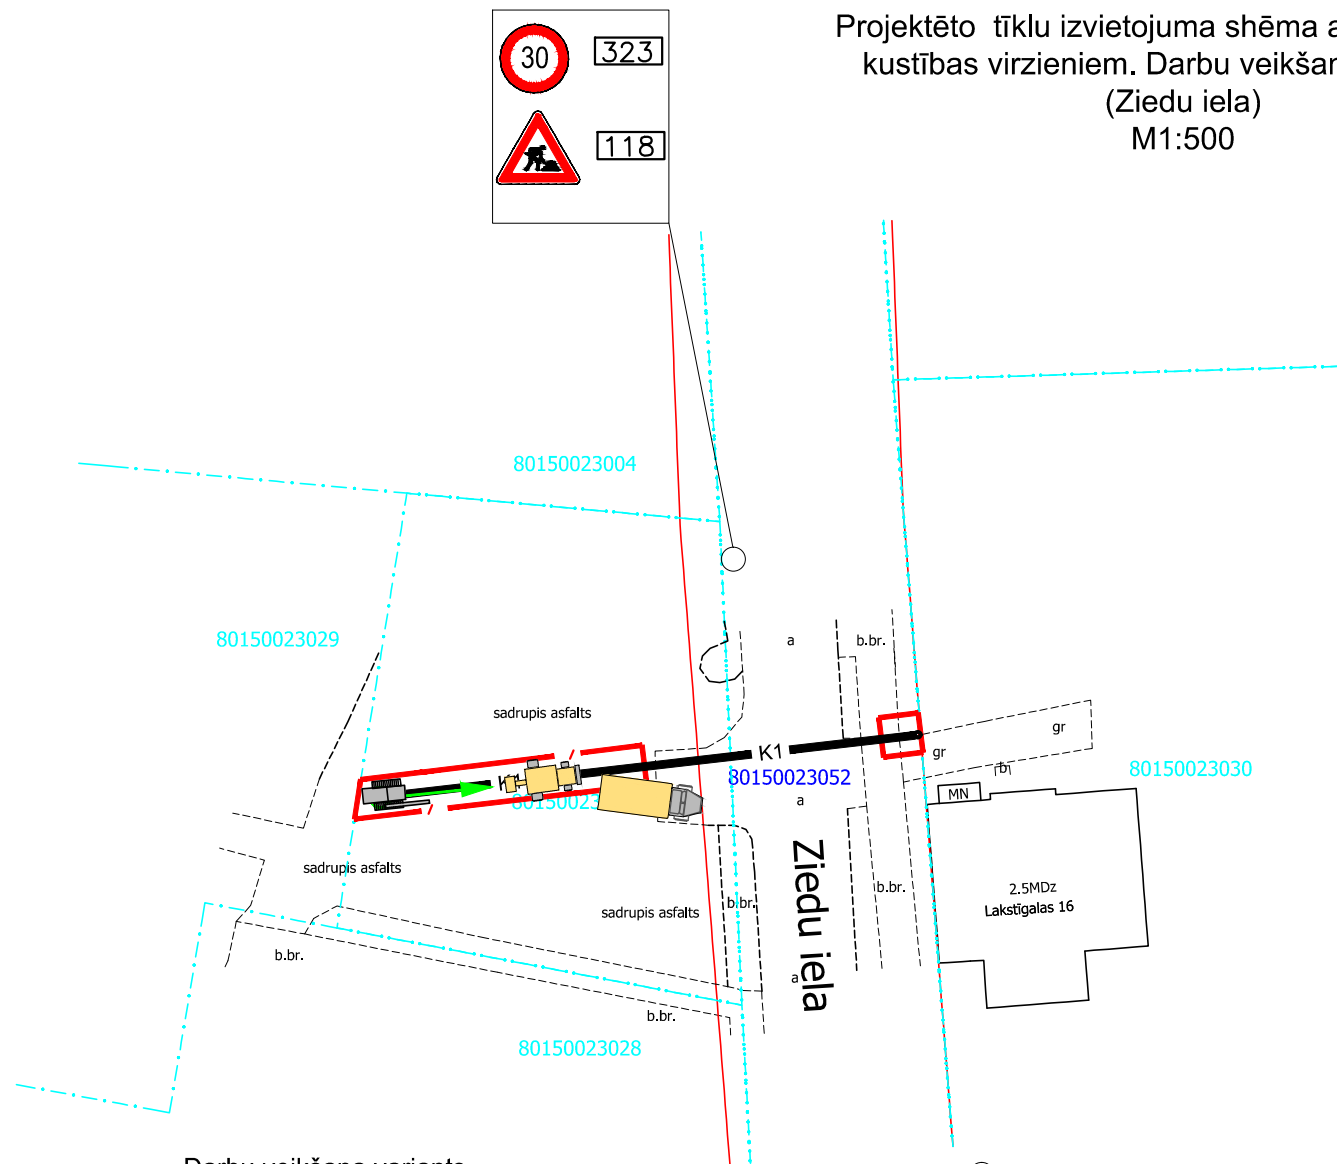

Darbu veikšana variants
PLĀNS (VARIANTS II)
B/M

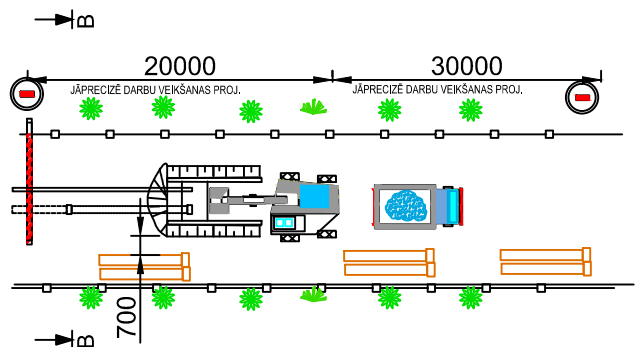


GRIEZUMS B - B
B/M

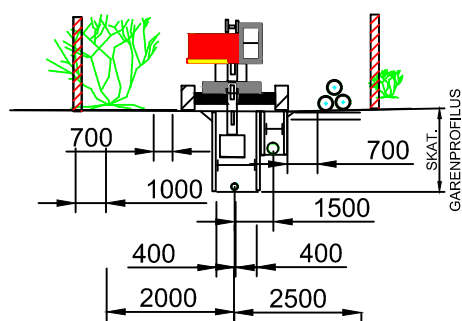

Piezīmes:

1. Pieņemtos apzīmējumus un Ceļu zīmju nosaukumus skatīties DOP-1 lapā.
2. Ziedu ielā nodrošināt nepārtrauktu transporta kustību. Būvbedres ielas zonā aizberamas uzreiz pēc darbu pabeigšanas.
3. Darbu veikšanas variants katrā posmā precizējams un saskaņojams ar Pasūtītāju un Pašvaldību.
4. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāpārbauda urbšanas tehnikas izvietojums.
5. Pirms urbšanas darbu uzsākšanas jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumi.
6. Ja nepieciešams atšūfēt esošās komunikācijas pirms tam saskaņojot atbildīgajās institūcijās.
7. PE caurdūruma caurules izbūve paredzēta ar ievilkšanas metodi.
8. Izbūvējot caurules ar beztranšējas metodi jāpieturas pie garenprofilos norādītajiem dziļumiem.
9. Būvuzņēmējam jāņem vērā visi papildus izdevumi, kas var rasties veicot caurdūrumu.
10. Seguma atjaunošana ārpus labiekārtojuma darba robežām izpildāmā esošajās augstuma atzīmēs.
11. Seguma kvalitātei jāatbilst esošā seguma kvalitātei.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS: SIA "Saltavots" Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150 		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā", 2.posms"	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		10.2019.		MARKA:	DOP
					LAPAS NR.:	6
				RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	17
				Projektēto tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas kustības virzieniem. Darbu veikšanas variants. (Ziedu iela)	MĒROGS:	1:500
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
FAILS:						

Līdzfinansētājs:



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
